RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION

ANSD
Agence Nationale de
la Statistique et de la Démographie

PHASAOC

SISE PHASAOC

- **Exécution financière**
- **Etat d'avancement des activités de l'année en cours (2026)**
- **Indicateurs de performance**

Objectif Général

Améliorer la performance statistique du Sénégal, d'harmoniser les concepts et méthodologies, et de renforcer la modernisation du SSN.

Financement & Période

Financement: 84,9 millions d'euros (Crédits IDA – Banque mondiale)
Période: 7 Déc. 2023 – 15 Déc. 2028

PHASAOC SN

Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre

Architecture: 04 composantes structurantes couvrant la production statistique, les réformes, la modernisation de l'infrastructure

Composante 1

Harmonisation et production de statistiques de base à l'aide de méthodologies harmonisées

Composante 2

Modernisation et réformes statistiques ; accès aux données, diffusion et utilisation ; capital humain

Composante 3

Soutien à la modernisation de l'infrastructure physique

Composante 4

Gestion de projet et suivi & évaluation

Dernière mise à jour : 23/01/2026

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION

ANSD
Agence Nationale de
la Statistique et de la Démographie

PHASAOC

EXÉCUTION FINANCIÈRE

- Montants des exécutions financière
- Taux d'exécution financière

Objectif Général

Améliorer la performance statistique du Sénégal, d'harmoniser les concepts et méthodologies, et de renforcer la modernisation du SSN.

Financement & Période

Financement: 84,9 millions d'euros (Crédits IDA – Banque mondiale)
Période: 7 Déc. 2023 – 15 Déc. 2028

PHASAOC SN

Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre

Architecture: 04 composantes structurantes couvrant la production statistique, les réformes, la modernisation de l'infrastructure

Composante 1

Harmonisation et production de statistiques de base à l'aide de méthodologies harmonisées

Composante 2

Modernisation et réformes statistiques ; accès aux données, diffusion et utilisation ; capital humain

Composante 3

Soutien à la modernisation de l'infrastructure physique

Composante 4

Gestion de projet et suivi & évaluation

Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre

Dernière mise à jour : 23/01/2026


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION

ANSD
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie


PHASAOC | Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre

Montants des exécutions financière (Date: 31/12/2025)

Montant Global

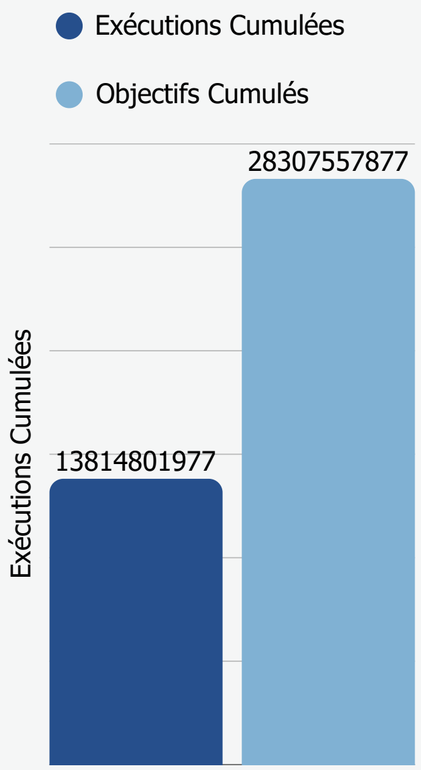

Montants annuels

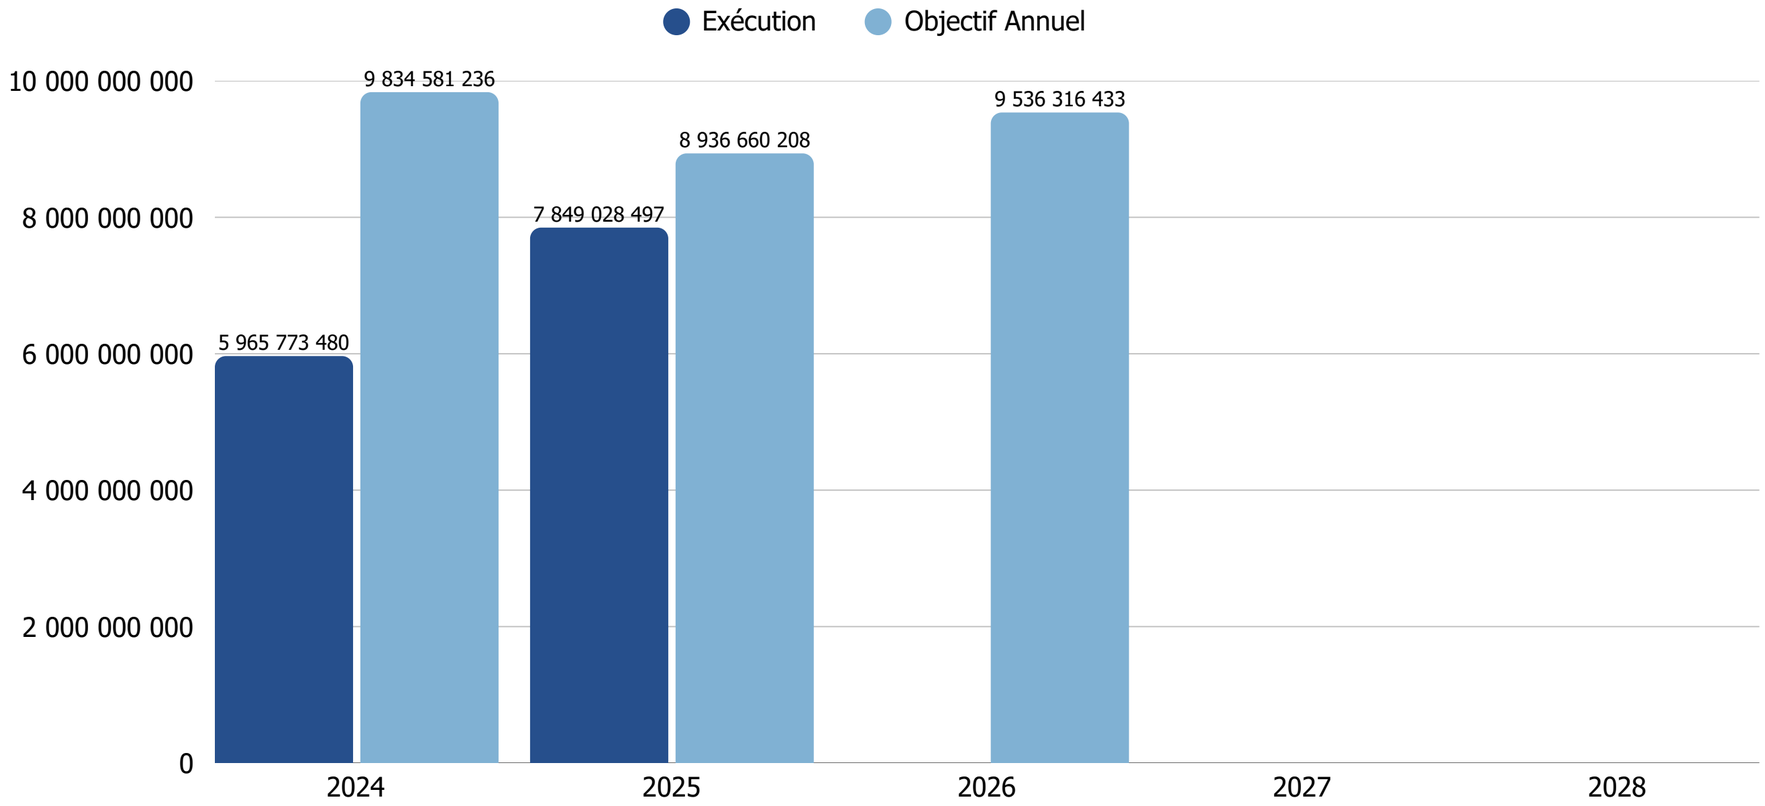


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION

ANSD
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie


PHASAOC | Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre

Taux d'exécution financière (Date: 31/12/2025)

Taux Global

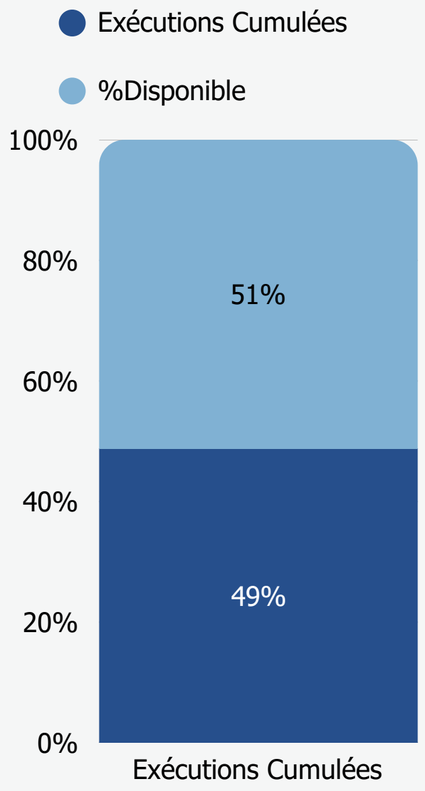

Taux annuels

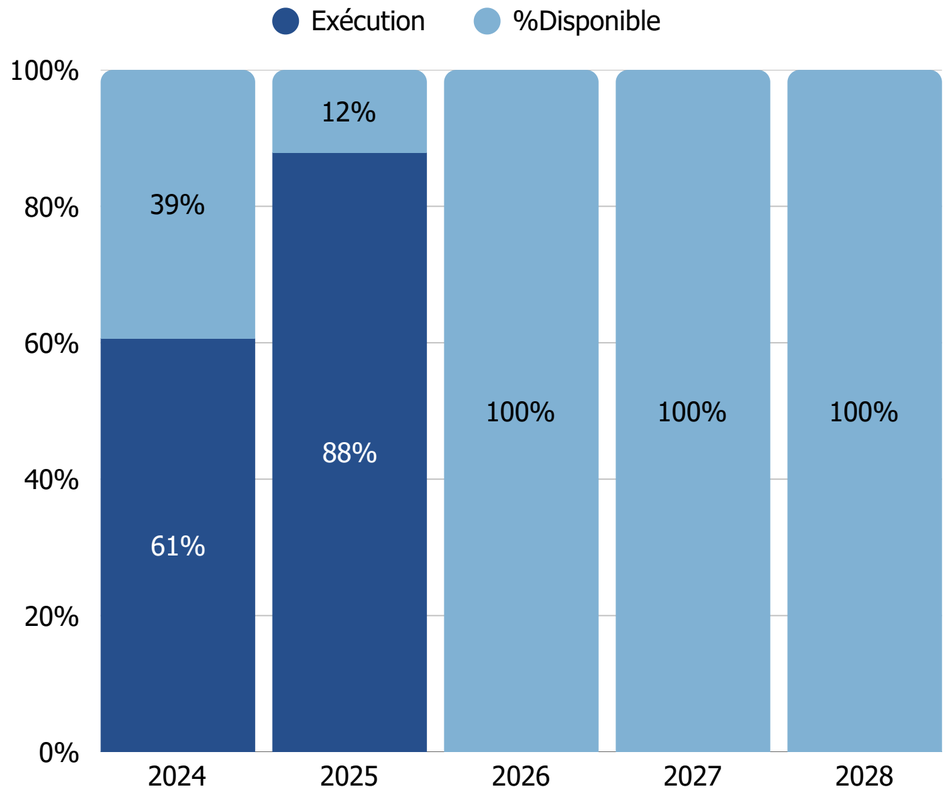

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION

ANSD
Agence Nationale de
la Statistique et de la Démographie

PHASAOC

ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS DE L'ANNÉE EN COURS (2026)

- Montants des exécutions financière (2026)
- Taux d'exécution financière (2026)
- Statuts des activités phares

Objectif Général

Améliorer la performance statistique du Sénégal, d'harmoniser les concepts et méthodologies, et de renforcer la modernisation du SSN.

Financement & Période

Financement: 84,9 millions d'euros (Crédits IDA – Banque mondiale)
Période: 7 Déc. 2023 – 15 Déc. 2028

PHASAOC SN

Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre

Architecture: 04 composantes structurantes couvrant la production statistique, les réformes, la modernisation de l'infrastructure

Composante 1

Harmonisation et production de statistiques de base à l'aide de méthodologies harmonisées

Composante 2

Modernisation et réformes statistiques ; accès aux données, diffusion et utilisation ; capital humain

Composante 3

Soutien à la modernisation de l'infrastructure physique

Composante 4

Gestion de projet et suivi & évaluation

Dernière mise à jour : 23/01/2026

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION

ANSD
Agence Nationale de
la Statistique et de la Démographie

PHASAOC

ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS (2026)

- **RGE**
- **RN/OCB**
- **EHCVM**
- **EDS Continue**
- **SIME/ANPEJ**

Objectif Général

Améliorer la performance statistique du Sénégal, d'harmoniser les concepts et méthodologies, et de renforcer la modernisation du SSN.

Financement & Période

Financement: 84,9 millions d'euros (Crédits IDA – Banque mondiale)
Période: 7 Déc. 2023 – 15 Déc. 2028

PHASAOC SN

Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre

Architecture: 04 composantes structurantes couvrant la production statistique, les réformes, la modernisation de l'infrastructure

Composante 1

Harmonisation et production de statistiques de base à l'aide de méthodologies harmonisées

Composante 2

Modernisation et réformes statistiques ; accès aux données, diffusion et utilisation ; capital humain

Composante 3

Soutien à la modernisation de l'infrastructure physique

Composante 4

Gestion de projet et suivi & évaluation

Dernière mise à jour : 11/03/2026


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION

ANSD
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

PHASAOC | Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre

Suivi des diligences - RGE

Suivi des diligences - RGE 2026

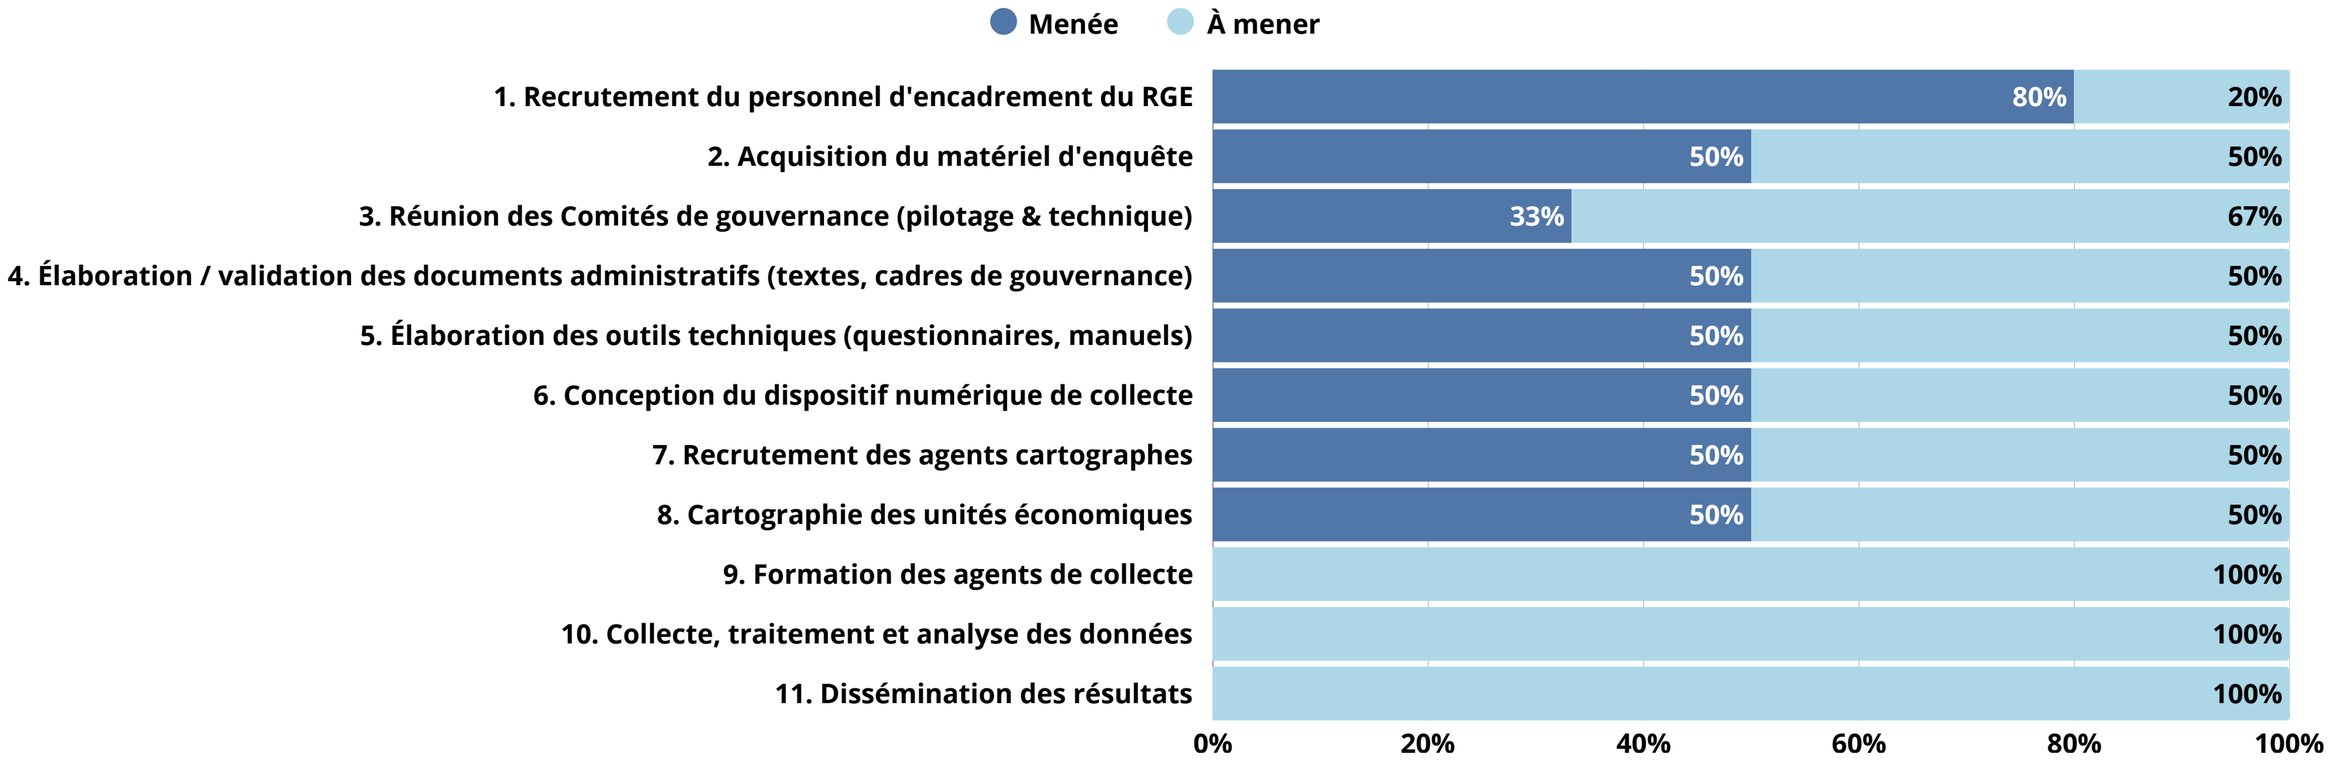


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION

ANSD
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

PHASAOC | Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre

Suivi des diligences - RGE

Taux d'exécution physique

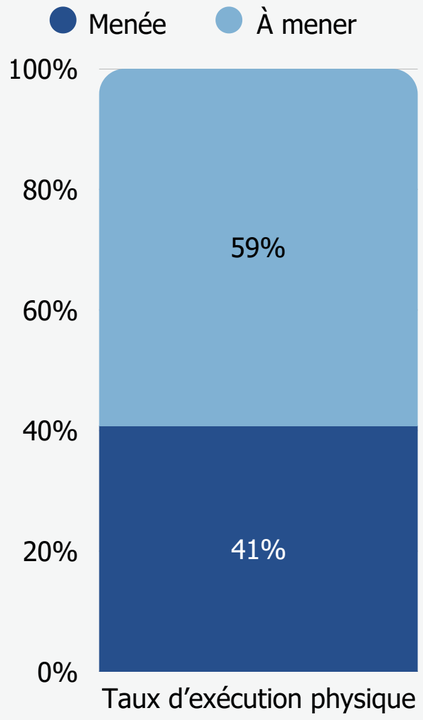

Montants annuels

Niveau global d'exécution

- **Taux d'exécution physique : 41 %**
- **Activités réalisées ou en cours : 6 sur 11 (11 actions menées sur 27)**
- **Principales phases opérationnelles (formation, collecte, analyse, dissémination) restent à démarrer**

Principales réalisations

- Recrutement du personnel d'encadrement largement engagé (80 %)
- Outils techniques et dispositif numérique en cours d'élaboration (50 %)
- Cadre de gouvernance et documents administratifs en cours de finalisation
- Cartographie et recrutement des cartographes amorcés (50 %)

Prochaines étapes clés

- Finalisation des recrutements et acquisitions logistiques
- Validation des outils méthodologiques et techniques
- Formation des agents de collecte
- Lancement de la cartographie nationale et de la collecte des données


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION

ANSD
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

PHASAOC | Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre

Suivi des diligences - RN/OCB

Suivi des diligences - RN/OCB 2026

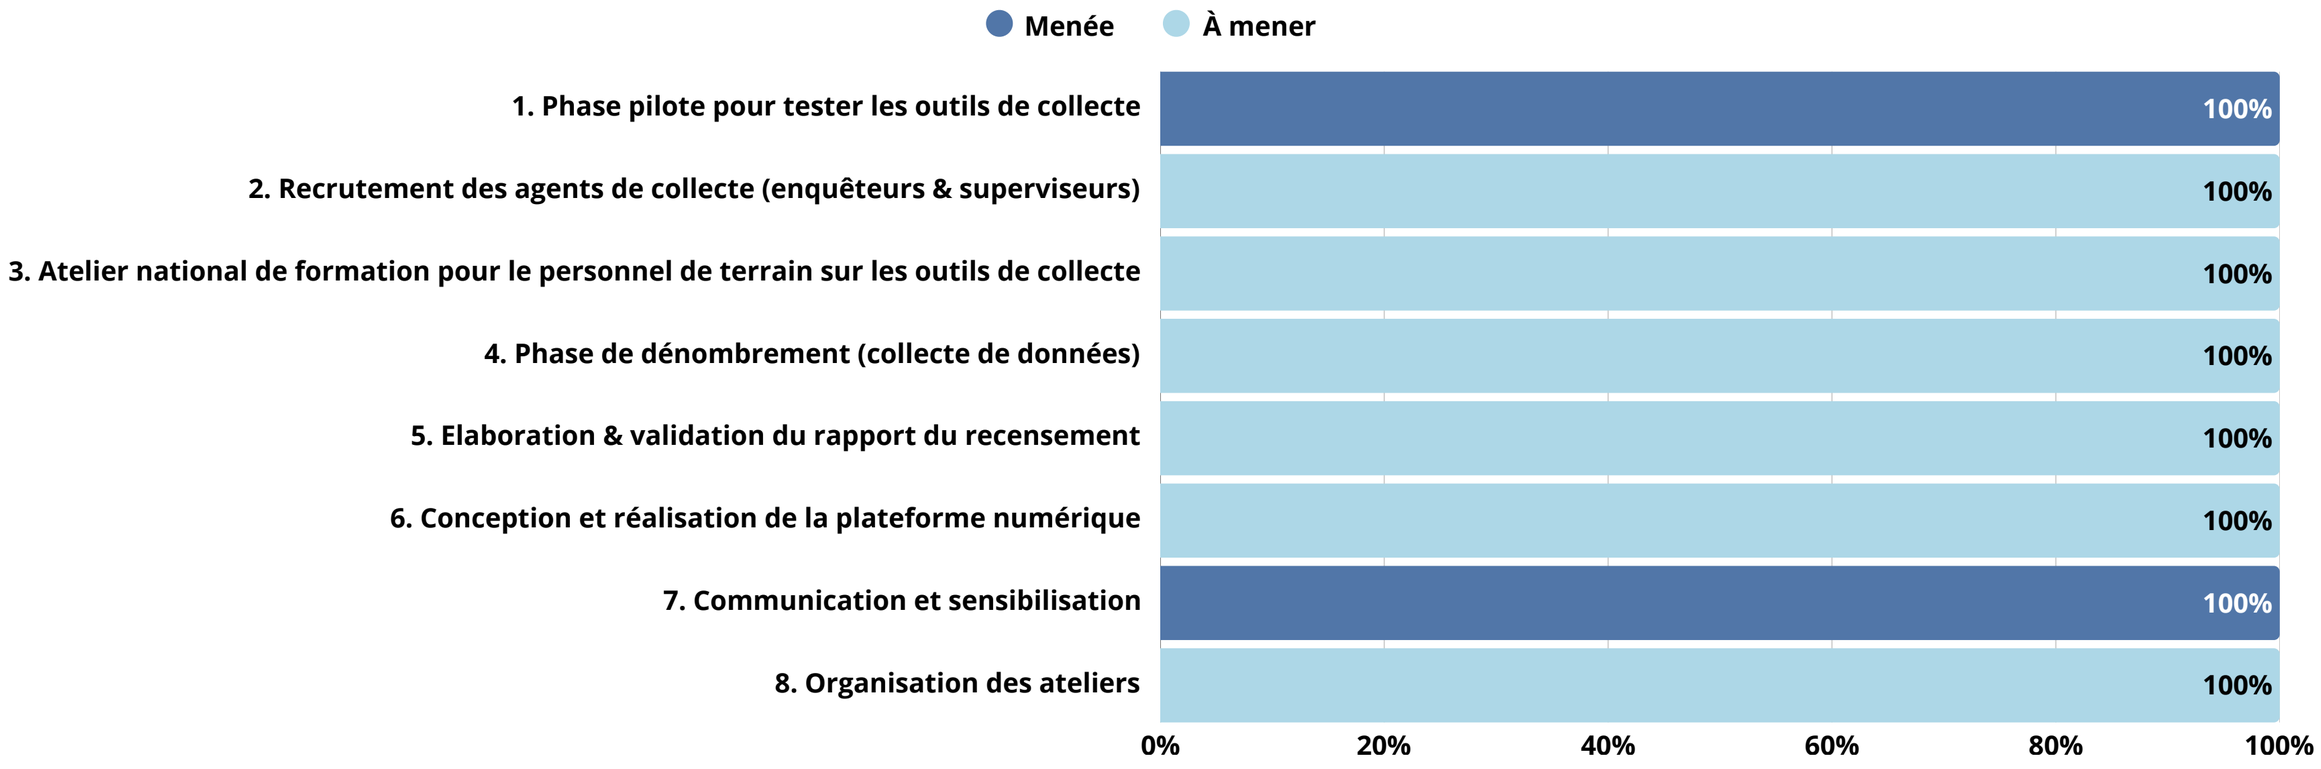


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION

ANSD
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

PHASAOC | Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre

Suivi des diligences - RN/OCB

Taux d'exécution physique

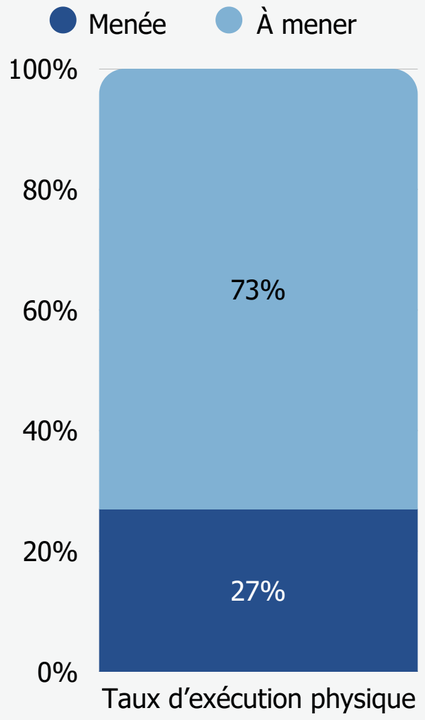

Montants annuels

Niveau global d'exécution

- **Taux d'exécution physique : 27 %**
- **Le projet se situe encore dans la phase préparatoire (7 actions menées sur 26)**
- **Les activités opérationnelles majeures (recrutement, formation, collecte) restent à lancer**

Principales réalisations

- Phase pilote réalisée (100 %) : test des outils de collecte avec 22 agents certifiés et production du rapport pilote
- Communication et sensibilisation achevées (100 %) : plan de communication, correspondances administratives et diffusion médiatique

Prochaines étapes clés

- Recrutement des enquêteurs et superviseurs au niveau régional
- Organisation de la formation nationale du personnel de terrain
- Lancement du dénombrement des OCB sur l'ensemble du territoire
- Développement de la plateforme numérique et production du rapport du recensement


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION

ANSD
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

PHASAOC | Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre

Suivi des diligences - EHCVM

Suivi des diligences - EHCVM 2026

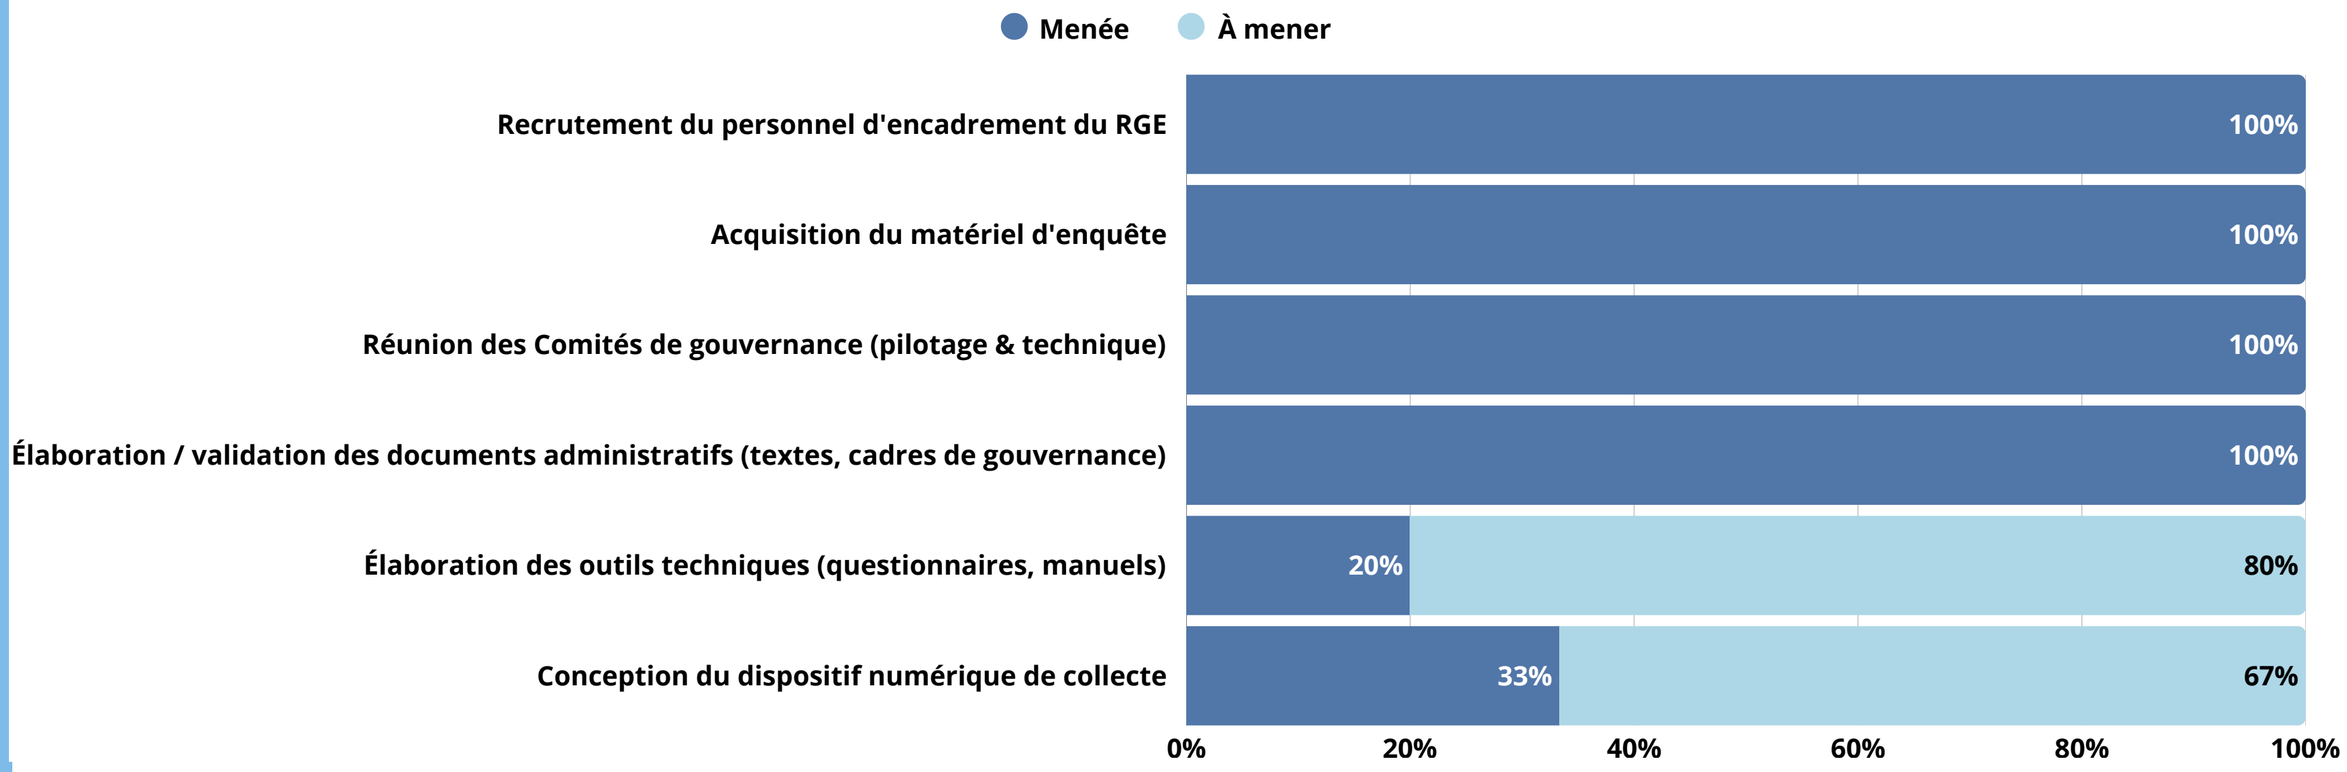


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION

ANSD
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

PHASAOC | Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre

Suivi des diligences - EHCVM

Taux d'exécution physique

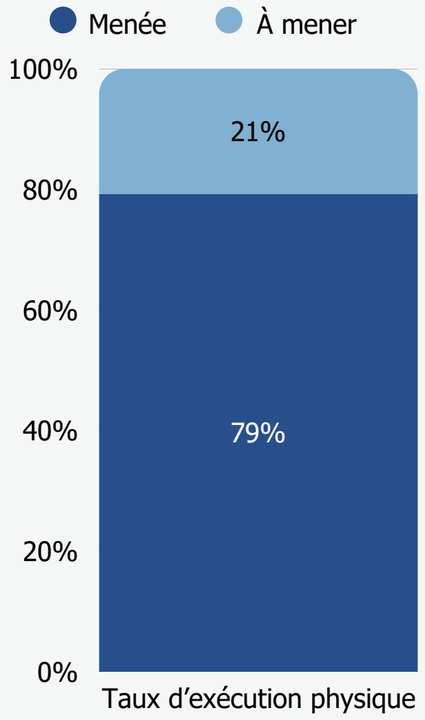

Montants annuels

Niveau global d'exécution

- **Taux d'exécution physique : 79 %**
- **4 activités sur 6 entièrement réalisées (23 actions menées sur 29)**
- **Le projet se situe actuellement en phase finale de traitement et d'analyse des données**

Principales réalisations

- Activités préparatoires et logistiques entièrement réalisées (équipements, logiciels, tablettes, connexion internet).
- Collecte des données achevée (NSU, enquête pilote CAPI, vagues 1 et 2 auprès des ménages).
- Formation et déploiement du personnel de terrain réalisés.
- Supervision et coordination des opérations de terrain assurées.

Prochaines étapes clés

- Traitement et apurement final des données collectées
- Rédaction et validation du rapport national sur la pauvreté
- Reproduction des rapports et dissémination des résultats
- Organisation des ateliers de présentation des résultats


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION

ANSD
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

PHASAOC | Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre

Suivi des diligences - EDS Continue

Suivi des diligences - EDS Continue 2026

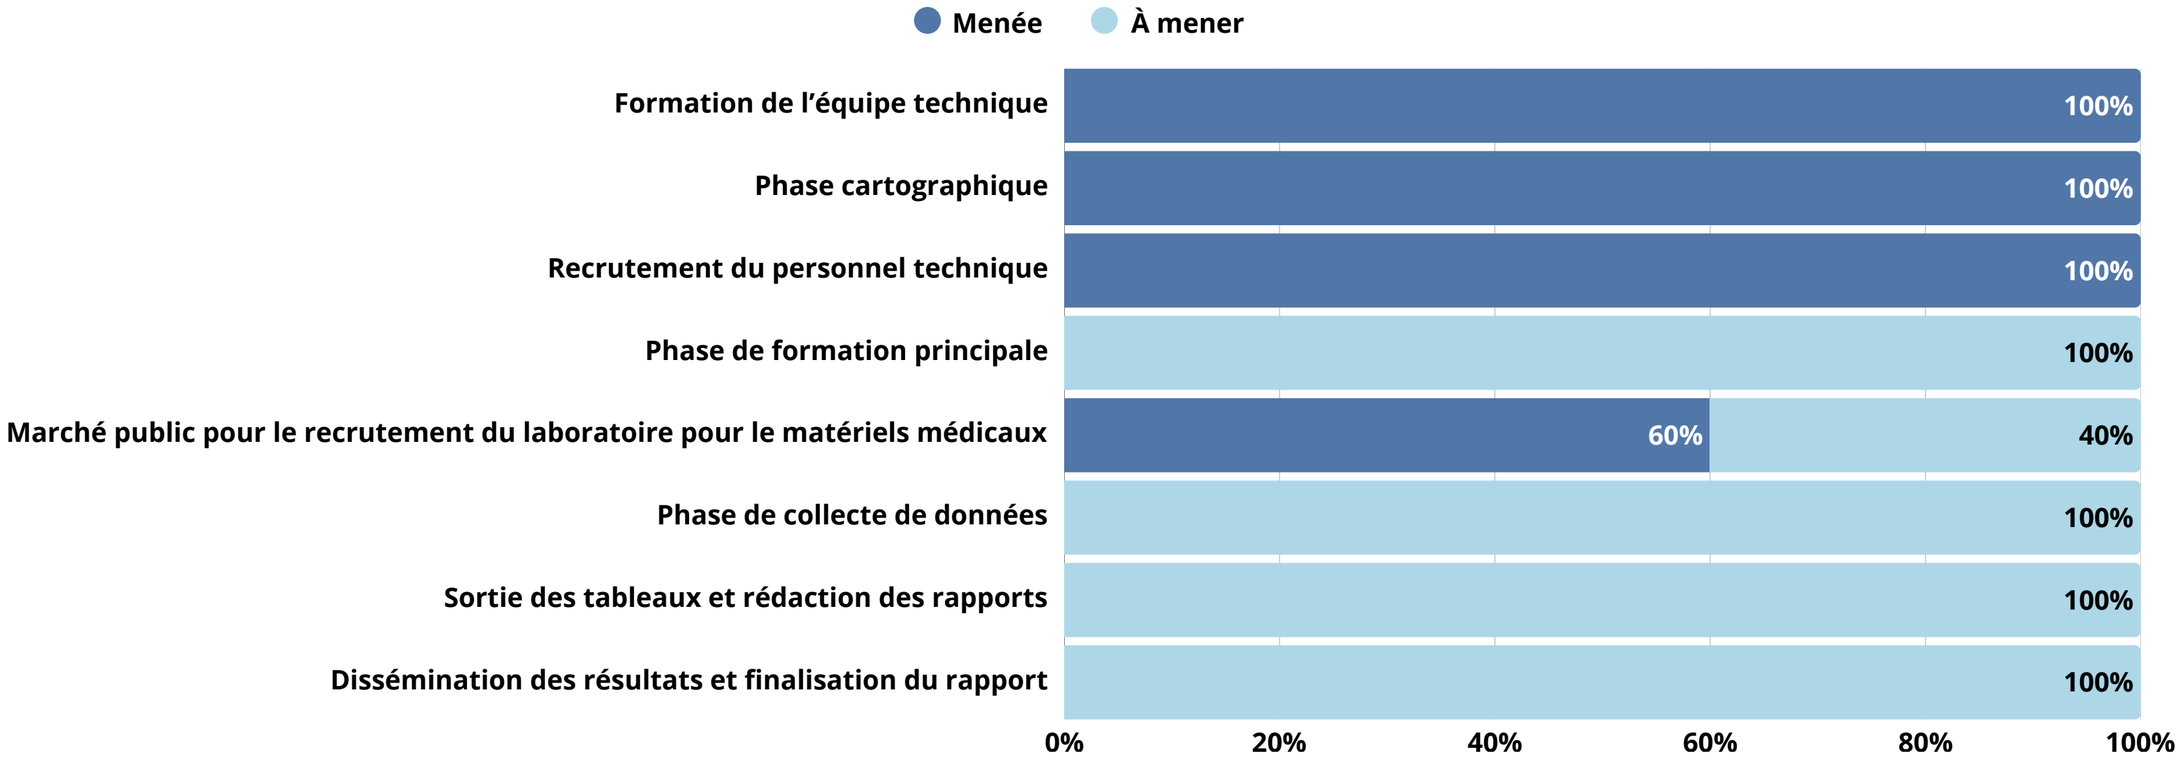


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION

ANSD
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

PHASAOC | Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre

Suivi des diligences - EDS Continue

Taux d'exécution physique

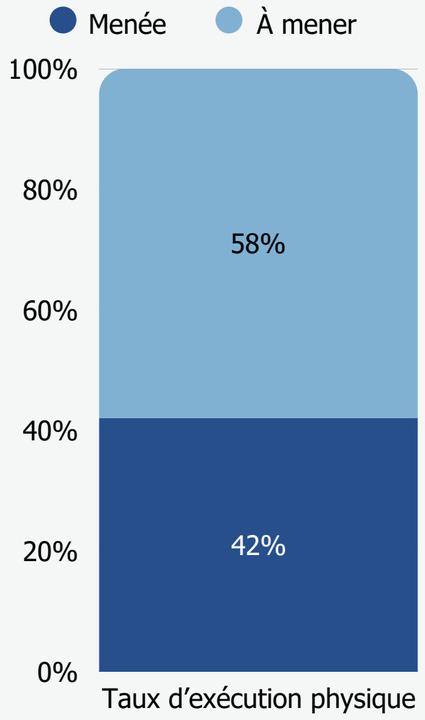

Montants annuels

Niveau global d'exécution

- **Taux d'exécution physique : 42 %**
- **3 activités sur 8 finalisées (16 actions menées sur 38)**
- **Le projet se situe encore dans la phase préparatoire et organisationnelle**

Principales réalisations

- Formation de l'équipe technique entièrement réalisée
- Phase cartographique achevée (échantillonnage, mise à jour terrain, tirage des ménages)
- Recrutement du personnel technique finalisé
- Procédure de recrutement du laboratoire biomédical largement avancée (60 %)

Prochaines étapes clés

- Formation principale des enquêteurs et techniciens de santé
- Finalisation du marché des laboratoires biomarqueurs
- Lancement de la collecte nationale des données
- Traitement, analyse et production des rapports
- Dissémination des résultats


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION

ANSD
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

PHASAOC | Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre

Suivi des diligences - SIME/ANPEJ

Suivi des diligences - SIME/ANPEJ 2026

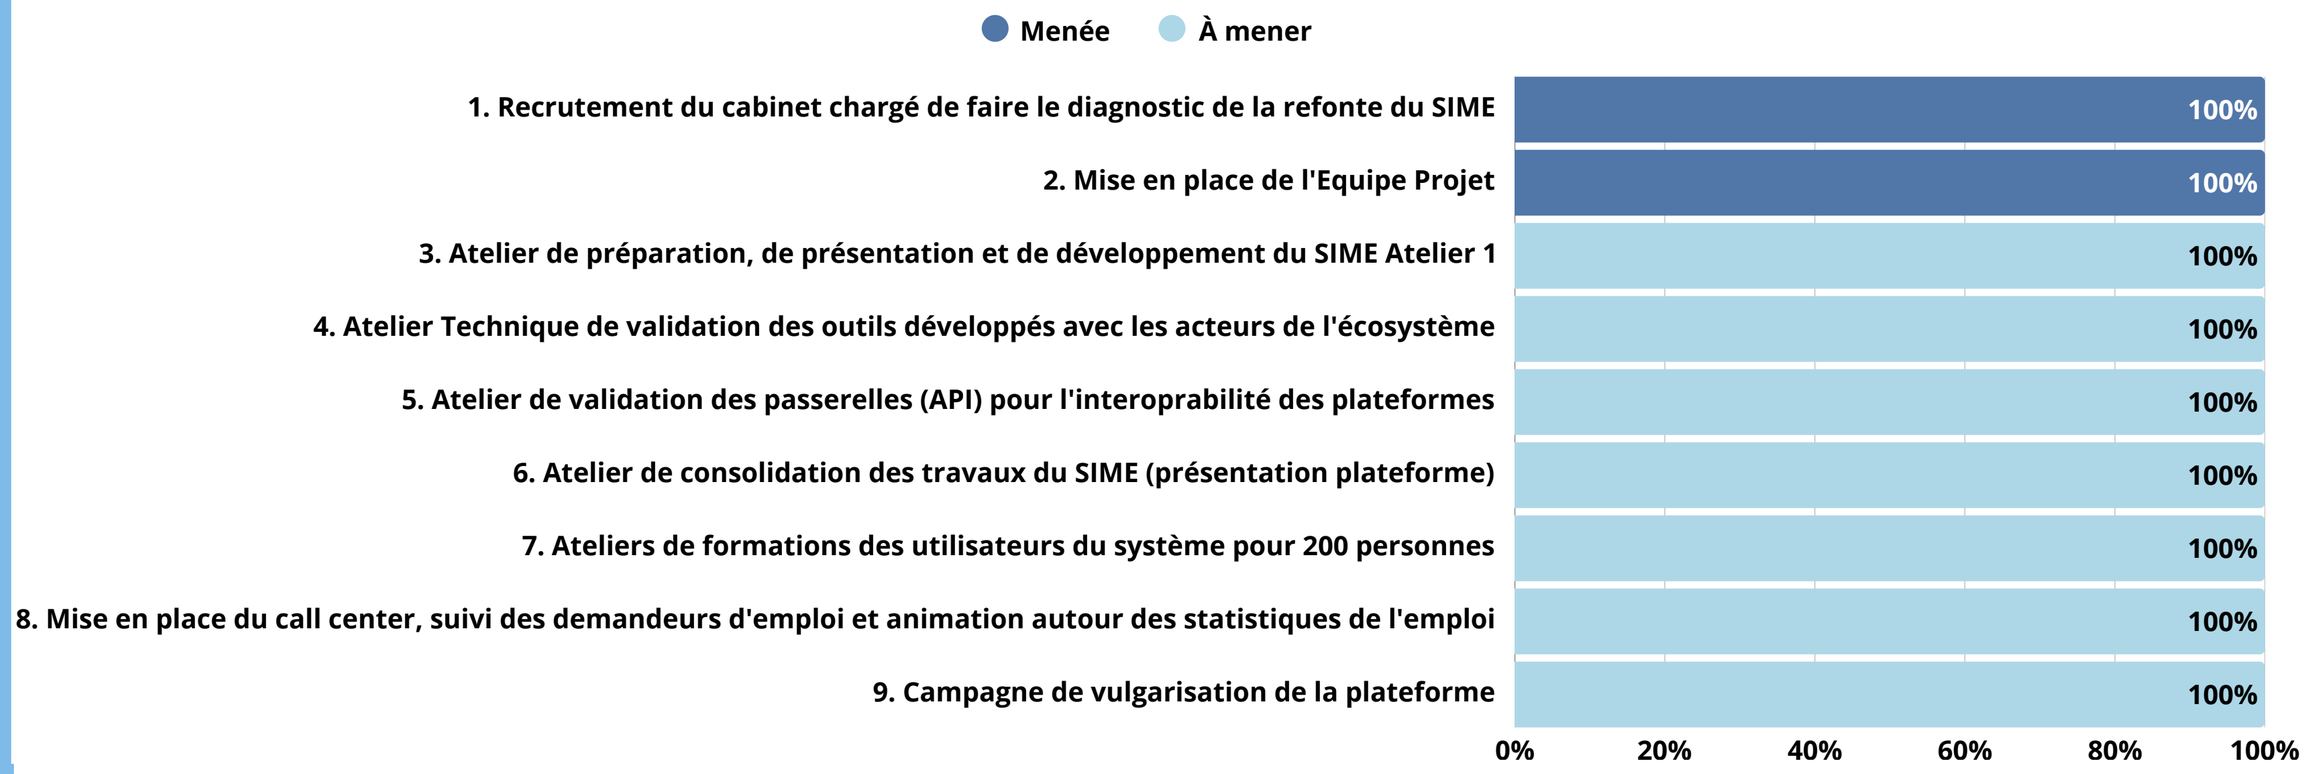


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION

ANSD
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

PHASAOC | Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre

Suivi des diligences - SIME/ANPEJ

Taux d'exécution physique

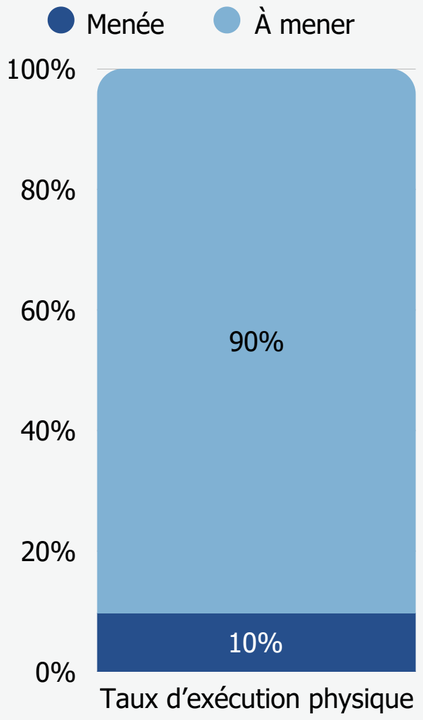

Montants annuels

Niveau global d'exécution

- **Taux d'exécution physique : 10 %**
- **2 activités sur 9 réalisées (3 actions menées sur 31)**
- **Le projet est actuellement en phase de préparation et de diagnostic**

Principales réalisations

- Recrutement du cabinet KGM Consulting pour le diagnostic de la refonte du SIME (mission en cours).
- Mise en place de l'équipe projet (experts techniques et fonctionnels mobilisés).
- Transmission des PV des entretiens à la Banque mondiale pour Avis de Non-Objection (ANO).

Prochaines étapes clés

- Organisation de l'atelier de préparation et de développement du SIME (Atelier 1) basé sur les résultats du diagnostic.
- Validation technique des outils et des passerelles d'interopérabilité (API) avec les acteurs de l'écosystème.
- Consolidation de la plateforme, formation de 200 utilisateurs, mise en place du call center et lancement de la campagne de vulgarisation.


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION

ANSD
Agence Nationale de
la Statistique et de la Démographie

PHASAOC

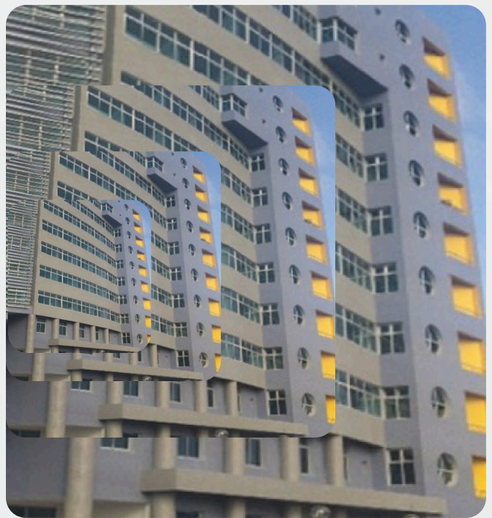

INDICATEURS DE PERFORMANCES

Objectif Général

- 0.1- Augmentation de l'indice de performance statistique du Sénégal, adapté aux variables que le projet influencera
- 0.2- Augmentation du nombre d'utilisateurs satisfaits de l'accessibilité des produits statistiques générés par le projet, tel que déterminé par l'enquête de satisfaction des utilisateurs
- 0.3- Rapports produits à l'aide de statistiques issues de nouvelles sources de données produites ou soutenues dans le cadre du projet
- 0.4-Statistiques économiques et sociales de base harmonisées, produites conformément aux normes régionales applicables et mises à la disposition du public
- 0.5-Nouveaux produits statistiques produits grâce au financement du projet en utilisant des méthodes améliorées de collecte de données et de vérification informatisée des données

Composante 1


- 1.1- Manuels d'harmonisation régionale pour l'IPC, les comptes nationaux et l'enquête sur la pauvreté produits par l'UEMOA/CEDEAO
- 1.2- Nouveaux produits statistiques utilisant des enquêtes alignées sur le manuel d'harmonisation de la CEDEAO et d'autres nouvelles sources de données
- 1.3- Rapports sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de SHaSA2 produits par l'Union africaine (UA)/STATAFRIC
- 1.4- Liste minimale des indicateurs de genre de la DSNU disponibles à partir des données collectées dans le cadre du projet au cours des cinq dernières années

Composante 2

- 2.1-Les plateformes nationales sont mises à niveau pour permettre aux données nouvellement produites par le projet d'être stockées dans des archives de données sécurisées et accessibles au public
- 2.2-Publication des rapports provisoires sur les recensements et les enquêtes financés par le projet
- 2.3-Forums organisés entre producteurs et utilisateurs pour discuter de la conception de l'enquête, des résultats et des implications politiques
- 2.4-Formation du personnel du système statistique national pour qu'il participe à la production de nouvelles statistiques Homme /femme
- 2.5-Étudiants et étudiantes boursiers qui réussissent à obtenir leur diplôme (nombre)
- 2.6-Les cadres de qualité des données ont adopté le Manuel des cadres d'assurance qualité des Nations unies pour les statistiques officielles
- 2.7-Enquête de satisfaction des utilisateurs et producteurs (ESUP) menée


Composante 3

- 3.1- L'infrastructure physique et/ou informatique a été modernisée et est opérationnelle
- 3.2- L'infrastructure informatique a été modernisée et est opérationnelle




INDICATEURS DE PERFORMANCES


0.1- Augmentation de l'indice de performance statistique du Sénégal, adapté aux variables que le projet influencera

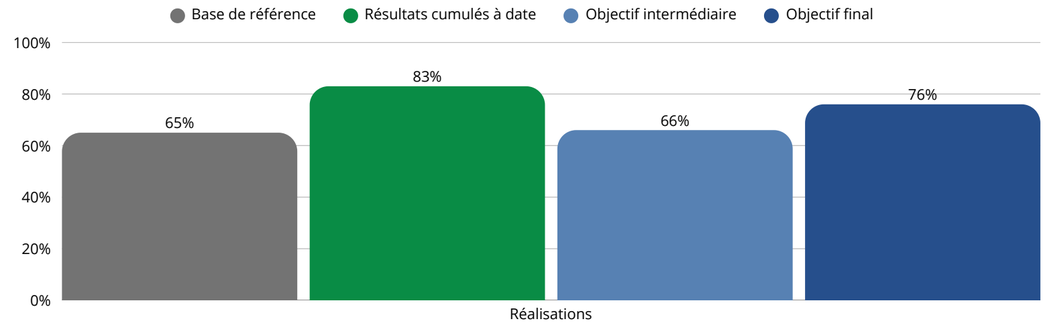


0.2- Augmentation du nombre d'utilisateurs satisfaits de l'accessibilité des produits statistiques générés par le projet, tel que déterminé par l'enquête de satisfaction des utilisateurs

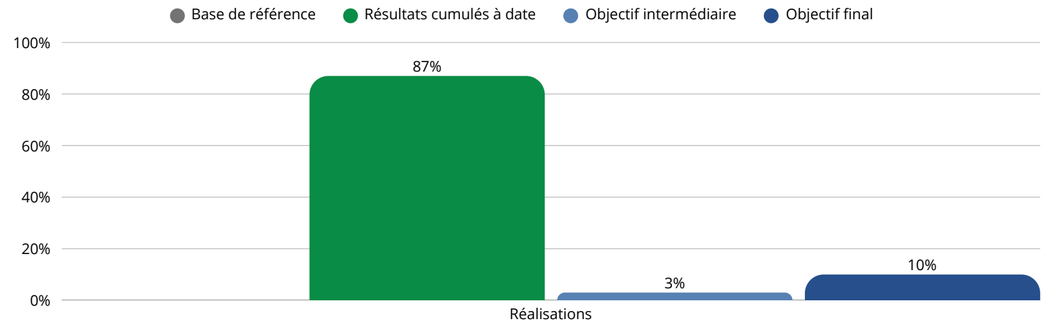

0.3- Rapports produits à l'aide de statistiques issues de nouvelles sources de données produites ou soutenues dans le cadre du projet

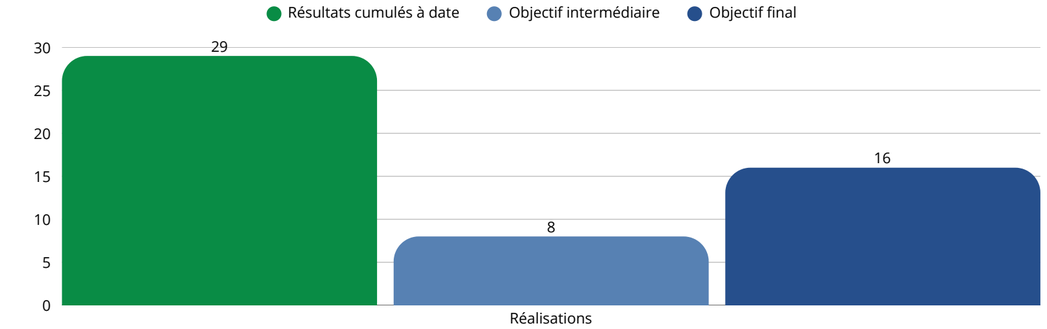


0.4-Statistiques économiques et sociales de base harmonisées, produites conformément aux normes régionales applicables et mises à la disposition du public

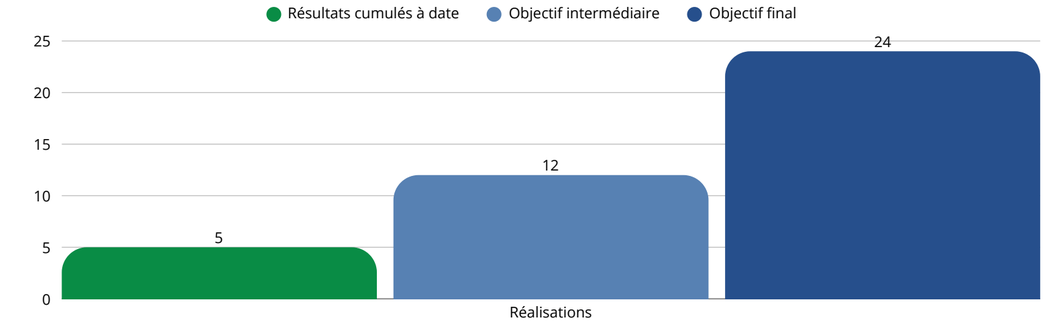


INDICATEURS DE PERFORMANCES


0.5-Nouveaux produits statistiques produits grâce au financement du projet en utilisant des méthodes améliorées de collecte de données et de vérification informatisée des données

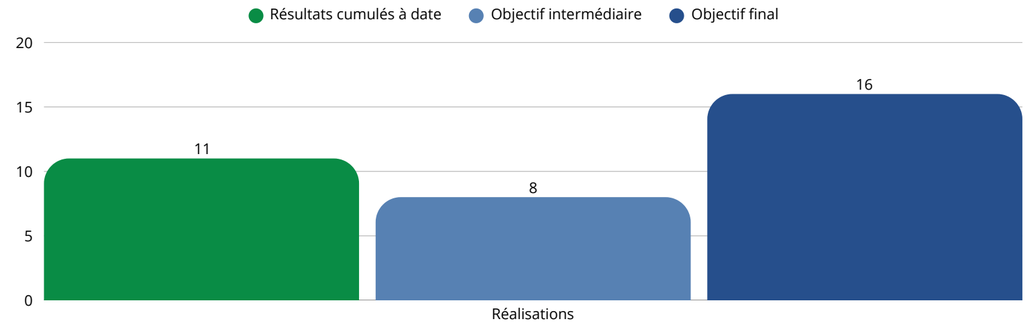


1.1- Manuels d'harmonisation régionale pour l'IPC, les comptes nationaux et l'enquête sur la pauvreté produits par l'UEMOA/CEDEAO

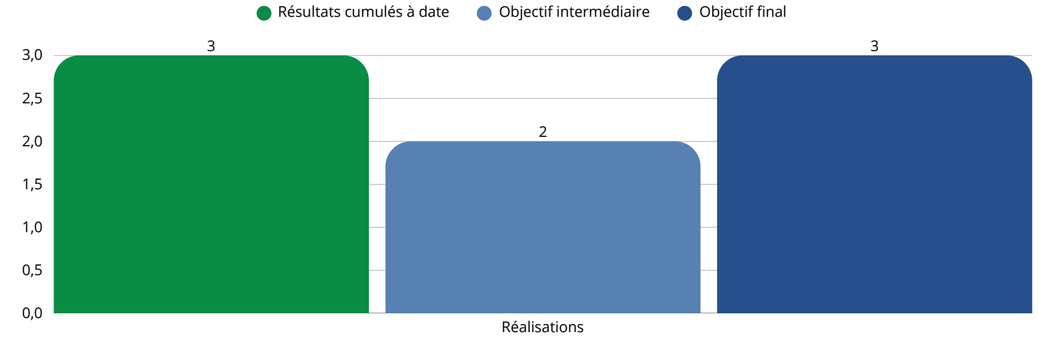

1.2- Nouveaux produits statistiques utilisant des enquêtes alignées sur le manuel d'harmonisation de la CEDEAO et d'autres nouvelles sources de données

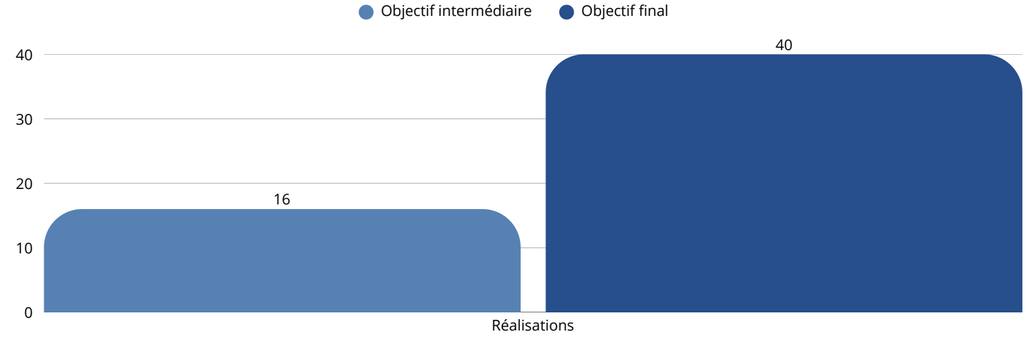


1.3- Rapports sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de SHaSA2 produits par l'Union africaine (UA)/STATAFRIC

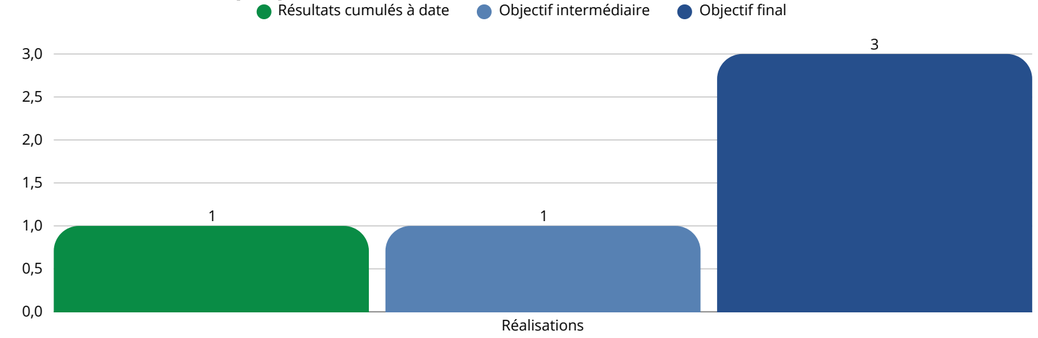


INDICATEURS DE PERFORMANCES


1.4- Liste minimale des indicateurs de genre de la DSNU disponibles à partir des données collectées dans le cadre du projet au cours des cinq dernières années

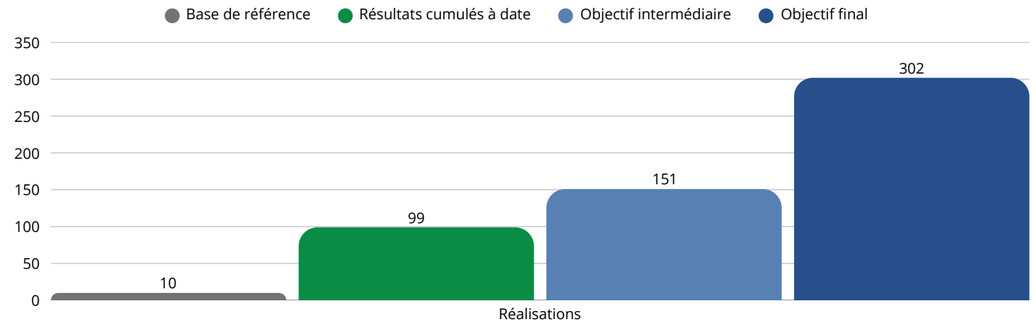


2.1-Les plateformes nationales sont mises à niveau pour permettre aux données nouvellement produites par le projet d'être stockées dans des archives de données sécurisées et accessibles au public



2.2-Publication des rapports provisoires sur les recensements et les enquêtes financés par le projet

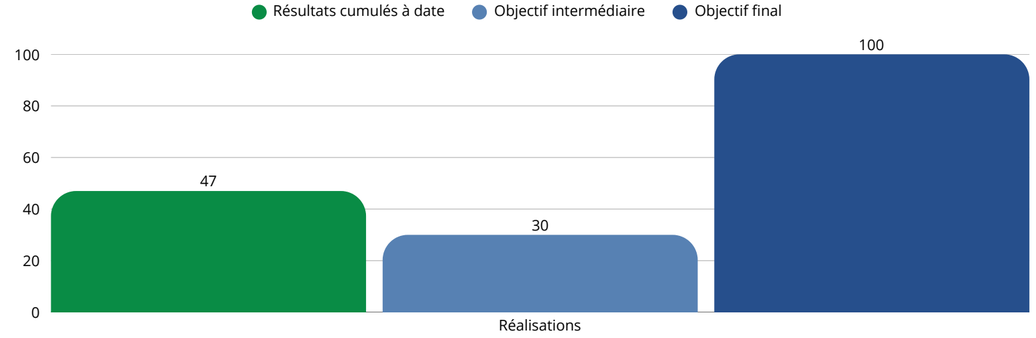


2.3-Forums organisés entre producteurs et utilisateurs pour discuter de la conception de l'enquête, des résultats et des implications politiques

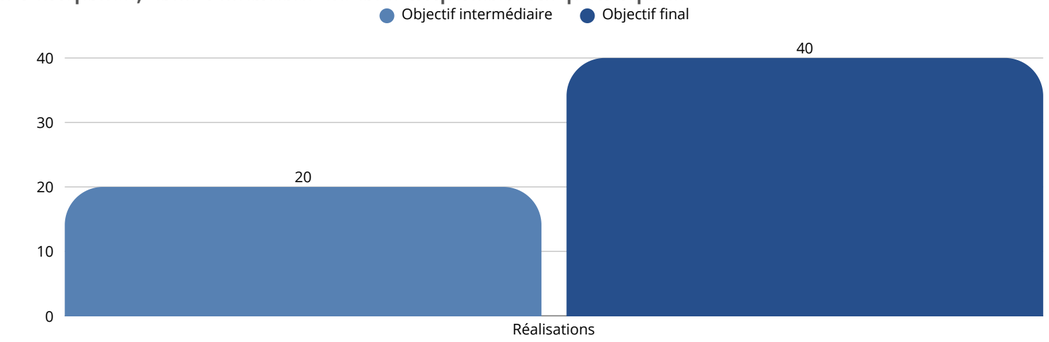


INDICATEURS DE PERFORMANCES


2.4-Formation du personnel du système statistique national pour qu'il participe à la production de nouvelles statistiques Homme /femme

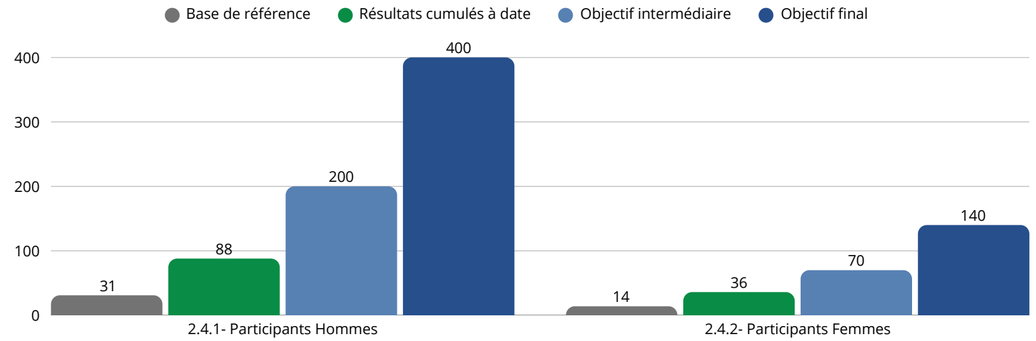


2.5-Étudiants et étudiantes boursiers qui réussissent à obtenir leur diplôme (nombre)

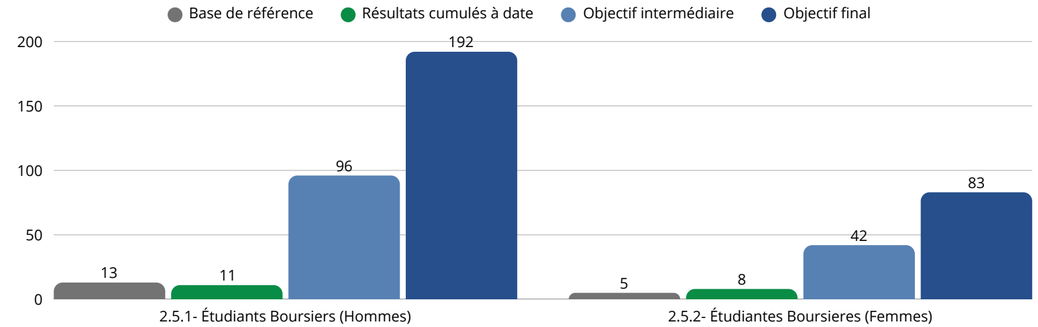

2.6-Les cadres de qualité des données ont adopté le Manuel des cadres d'assurance qualité des Nations unies pour les statistiques officielles




2.7-Enquête de satisfaction des utilisateurs et producteurs (ESUP) menée



INDICATEURS DE PERFORMANCES

3.1- L'infrastructure physique et/ou informatique a été modernisée et est opérationnelle



3.2- L'infrastructure informatique a été modernisée et est opérationnelle



ANSD
Agence Nationale de
la Statistique et de la Démographie

PHASAOC

PHASAOC SN

ANSD, Rocade Fann Bel-air Cerf-Volant BP 116 Dakar RP- Sénégal

Contacts / Coordonnateur technique du Projet

(+221) 33 869 21 58 / 77 501 76 01

meissa.ndour@ansd.sn
