SISEP — Feuille de route post-CR du 22/09/2026

1 oct. 2026 · @Doudou COLY

Contexte et décisions actées

La réunion du 22 septembre fait basculer SISEP du développement vers l'opérationnalisation : six chantiers restent à livrer avant le déploiement et la formation des utilisateurs. Le CR valide les fonctionnalités déjà en place (rôles et permissions, arborescence, indicateurs, exécution budgétaire, exports, diligences internes, relances par courriel) et concentre ses demandes sur trois manques — la granularité du suivi, la régularité des mises à jour, et deux domaines métier absents.

Sept arbitrages ont été pris après la réunion. Ils conditionnent la suite et sont considérés comme fermés.

Décision	Ce qu'elle implique
Les sous-activités ne sont plus un outil de découpage libre	Plus aucune création depuis l'interface ; les étapes normalisées les remplacent pour le suivi
Les sous-activités restent la maille budgétaire	Elles conservent dotations et engagements — 75 % des lignes budgétaires y sont rattachées, par alignement sur le PTBA 2026. Aucune migration de données
La progression d'une activité est dérivée de ses étapes	Elle n'est plus saisie ni stockée, conformément à la règle du projet sur les grandeurs dérivées
Les étapes reposent sur un gabarit paramétrable réutilisable	Défini par le responsable suivi-évaluation et l'administrateur, instancié sur chaque activité
Le responsable suivi-évaluation devient super-admin du budget	Dérogation assumée à la séparation saisie/validation, compensée par la traçabilité (voir chantier 2)
Un livrable se rattache à une étape, avec quantité attendue et réalisée	Répond à la demande de quantification des réalisations du § 7 du CR

La liste du personnel est la liste de référence de l'équipe	Import initial puis gestion continue dans l'application, avec création, modification et suppression

Chantier 1 — Étapes d'activité

Une activité ne se suit plus par une appréciation globale mais par ses grandes étapes de réalisation, demande centrale du § 6 du CR. C'est le chantier qui conditionne tous les autres.

Deux notions nouvelles. Le **gabarit d'étapes** est un modèle réutilisable — préparation, production ou mise à disposition des équipements, formation, phase pilote, déploiement terrain, suivi, restitution — créé et modifié par le responsable suivi-évaluation et l'administrateur. L'**étape d'activité** en est une instance sur une activité donnée ; elle porte le niveau atteint, la valeur actuelle, la date de mise à jour, l'observation et les pièces justificatives associées, soit exactement les quatre champs demandés en réunion.

Chaque étape peut porter un ou plusieurs **livrables**, avec une quantité attendue et une quantité réalisée. C'est ce qui rend les réalisations objectivement appréciables, au-delà d'un pourcentage déclaratif.

La progression de l'activité se calcule à partir de l'avancement de ses étapes, à la demande, sans jamais être stockée. Le mécanisme actuel qui alimente l'avancement des sous-activités à partir des réalisations sort donc du circuit de suivi.

Les sous-activités changent de rôle sans disparaître : elles restent la maille budgétaire du PTBA et conservent dotations et engagements, mais perdent avancement et réalisations, et leur création disparaît de l'interface. Aucune ligne budgétaire n'est déplacée.

Côté droits : définir un gabarit relève du responsable suivi-évaluation et de l'administrateur ; renseigner une étape relève du responsable de l'activité, dans la portée de sa structure.

Chantier 2 — Budget : dérogation et traçabilité

Le responsable suivi-évaluation reçoit l'ensemble des droits budget, saisie et validation comprises. C'est une entorse délibérée à une règle que le projet s'était donnée comme non négociable — la séparation saisie/validation du § 7.2 du brief — et elle sera consignée comme telle dans les règles de développement, avec sa contrepartie. Sans cette inscription explicite, le code et la documentation affirmeraient le contraire de ce qu'ils font.

La contrepartie demandée en réunion — savoir qui a saisi, modifié ou validé quoi, et quand — existe déjà en grande partie : le journal d'activité intercepte automatiquement toute écriture sur les dotations, engagements et dépenses, en conservant l'état avant et après. Ce qui manque est son exploitation : une vue budget du journal, avec l'évolution de montant lisible d'un coup d'œil et le filtre par acteur et par période.

Chantier 3 — Ressources humaines

Le CR distingue avec insistance deux suivis de nature différente, et le modèle les sépare.

Le **personnel technique** est suivi nominativement : nom, prénom, sexe, profil, structure et activité ou opération de rattachement. Ses **contrats** sont des lignes distinctes portant date de début, date de fin et type ; un renouvellement crée un nouveau contrat plutôt que de modifier l'ancien, ce qui préserve l'historique des périodes contractuelles.

Les **enquêteurs** mobilisés ponctuellement sont suivis de façon agrégée par opération : effectif total, nombre de femmes, nombre d'hommes, activité ou PTBA de rattachement. C'est le choix explicite de la réunion, préféré à un suivi individuel systématique.

Aucune donnée salariale n'entre dans le système, conformément au § 14 du CR, et la rubrique est protégée par ses propres permissions.

Le tableau de bord découle de ce modèle : répartition par profil, par spécialité et par sexe, effectifs d'enquêteurs par opération et par activité, et capitalisation des emplois créés par le projet.

L'alimentation se fait en deux temps : import initial du fichier de référence de l'équipe, puis gestion continue dans l'application — création, modification et retrait — pour que la liste reste vivante sans repasser par un fichier.

Chantier 4 — Documents

Le CR mêlle deux besoins que la réalisation sépare.

Le premier est la **pièce jointe rattachée à un objet** : c'est déjà possible sur les activités, les indicateurs et les projets internes, il reste à l'ouvrir aux composantes.

Le second est une **bibliothèque documentaire de l'UGP** : un espace centralisé où déposer et classer les rapports de coordination, rapports trimestriels et annuels, comptes rendus, contrats et fichiers de calcul, avec recherche et niveaux de visibilité.

Le socle existe : le mécanisme de pièces jointes est déjà polymorphe et porte déjà des niveaux de visibilité. Seuls le classement et la recherche sont à construire.

Chantier 5 — Alertes et rappels planifiés

La réunion a tranché qu'il n'est pas acceptable que chaque utilisateur mette à jour ses informations à son propre rythme. Une commande s'exécute donc périodiquement sur le serveur de production et déclenche les rappels.

Elle couvre cinq cas : les valeurs d'indicateur non renseignées à l'échéance, les étapes sans mise à jour depuis trop longtemps, les rapports périodiques non transmis, les échéances d'activité dépassées et les fins de contrat approchant.

Les délais sont des paramètres, pas des constantes : le « quinze jours après la fin d'une période » évoqué en réunion se règle depuis l'administration. Chaque envoi est tracé pour ne pas relancer la même personne tous les jours.


Le transport est déjà opérationnel : la configuration SMTP et les courriels applicatifs ont été mis en service fin septembre.

Chantier 6 — Vue d'ensemble des composantes

La page Composantes reçoit les synthèses graphiques demandées au § 9 : avancement physique global, par composante et par activité, mis en regard de l'exécution financière. L'objectif affiché en réunion est de pouvoir rapprocher d'un coup d'œil ce qui a été dépensé et ce qui a été réalisé.

Ces graphiques deviennent exploitables une fois le chantier 1 livré, puisque l'avancement physique proviendra des étapes.

Séquencement

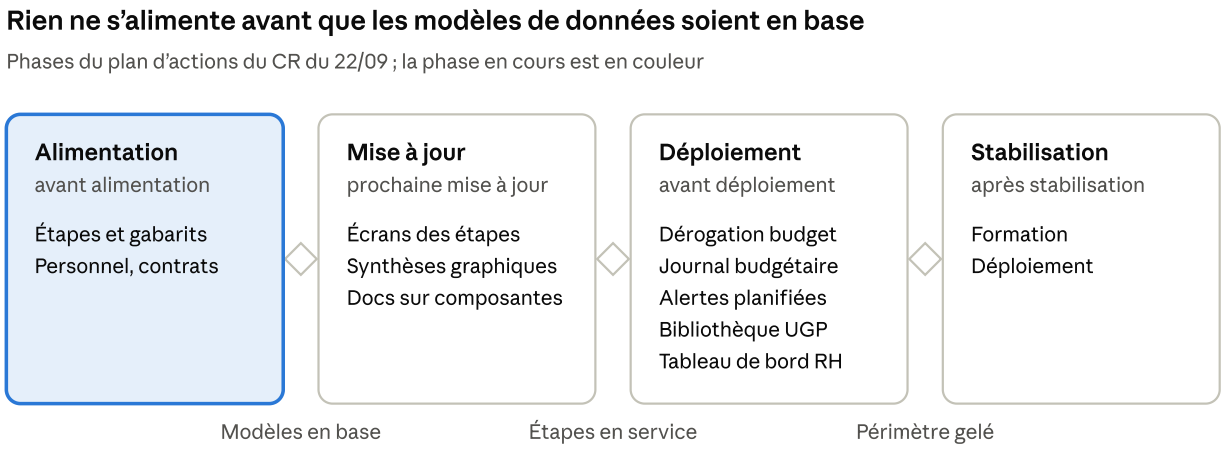

Les deux modèles de données ouvrent la marche : tant qu'ils ne sont pas en base, ni les fichiers reçus ni les synthèses d'avancement physique n'ont où se déposer.

Données de démarrage

Quatre des sept jeux de données listés au § 14 du CR sont déjà transmis. Il manque le budget, le niveau d'exécution et le type de contrat.

Donnée attendue au § 14 du CR	État	Fichier ou source
Liste des structures bénéficiaires et partenaires	Reçu	Contacts des points focaux 2026
Coordonnées utiles des responsables	Reçu	Le même fichier : téléphone et courriel par activité PTBA
Type d'activité réalisé par chaque structure	Reçu	Principales activités par structure bénéficiaire
Liste des personnels impliqués	Reçu	Situation du personnel 2026, complétée le 1er octobre
Type de contrat	Manquant	Absent des fichiers reçus
Budget alloué 2026 et révisions	Attendu	À transmettre
Niveau d'exécution actuel	Attendu	À transmettre

Deux réserves sur le fichier du personnel. C'est un état récapitulatif des sommes à payer : les montants et sous-totaux qu'il contient ne seront pas repris, conformément à la décision du CR sur le caractère sensible des données salariales. Il couvre en revanche désormais le sexe et les dates de début et de fin de contrat, ce qui le rend exploitable pour le chantier 3.
